


空調機メンテナンス報告書

お客様名:		〇〇〇〇ビル 1階〇〇〇〇店舗							
施工日時:		〇〇〇〇年〇〇月〇〇日				時間 9:00 ~ 19:00			
空調機No.	1		2		3		4		
メーカー名	ダイキン		ダイキン		ダイキン		ダイキン		
機種	四方向天カセ		四方向天カセ		四方向天カセ		四方向天カセ		
型式	FGEFP71K		FGEFP71K		FGEFP80K		LGY3M		
製品番号	〇〇〇〇〇〇		〇〇〇〇〇〇		〇〇〇〇〇〇		〇〇〇〇〇〇		
	施工前	施工後	施工前	施工後	施工前	施工後	施工前	施工後	
正常動作確認	○	○	○	○	○	○	○	○	
吸込温度(℃)	24.8	22.3	25.2	22.5	24.7	22.9	24.4	23.3	
吹出温度(℃)	37.4	37.1	39.1	38.1	38.1	37.6	7.6	6.3	
吸込風速(m)	1.8	2.5	1.1	2.5	1.2	2.6	1.8	3.5	
吹出風速(m)	2.7	5.5	2.9	5.4	2.1	5.5	3.1	7.4	
空調機No.	5		6		7		8		
メーカー名	ダイキン		ダイキン		ダイキン		ダイキン		
機種	四方向天カセ		四方向天カセ		四方向天カセ		四方向天カセ		
型式	FGEFP71K		FGEFP45K		FGEFP45K		FGEFP71K		
製品番号	〇〇〇〇〇〇		〇〇〇〇〇〇		〇〇〇〇〇〇		〇〇〇〇〇〇		
	施工前	施工後	施工前	施工後	施工前	施工後	施工前	施工後	
正常動作確認	○	○	○	○	○	○	○	○	
吸込温度(℃)	24.9	24.3	24.8	23.9	24.4	24.1	25.1	23.4	
吹出温度(℃)	25.4	36.5	26.4	36.5	26.5	36.4	37.4	36.9	
吸込風速(m)	1.8	2.3	1.0	2.4	1.2	2.5	1.8	2.6	
吹出風速(m)	2.4	5.3	1.1	4.0	1.2	4.2	2.6	5.5	

特記

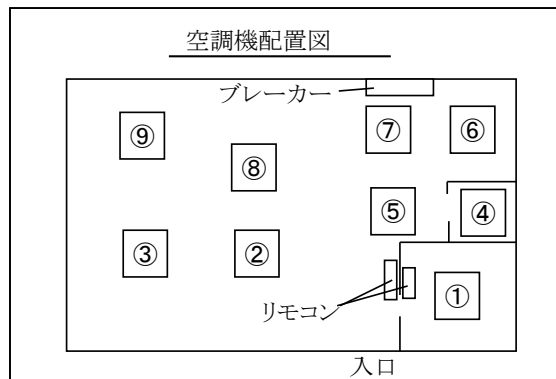

※上記報告書中の吹出・吸込の温度差は

- ・ 冷房時 5℃～15℃程度が正常です。
- ・ 暖房時 15℃～25℃程度が正常です。

ご確認印
